

## Introduction à la gestion de projet

**En quoi un projet de système d'information est-il une réponse au besoin d'évolution de l'organisation ?**

Plan du dossier:

1. Qu'est-ce qu'un projet ?
2. Quels sont les acteurs d'un projet ?
3. Quelles sont les priorités d'un projet ?
4. Le cycle de vie d'un projet
5. Les facteurs clés de réussite d'un projet de SI

### Contexte



Créé à Evry il y a 5 ans à l'initiative de Patrick Dasprivaut, Dem&Cie exerce dans le domaine d'activité du déménagement et du transport de meubles sur le territoire métropolitain, mais également le conseil (aide au déménagement, installation,...). Cependant la concurrence est rude et le directeur voudrait développer l'activité conseil afin d'augmenter sa part de marché à plus de 15%, mais le service commercial dispose de peu d'outils pour espérer atteindre cet objectif.

Il demande à sa DSI de lui préparer un projet pour aider sa force de vente.

Jeanne Maisse, directrice du système d'information de Dem&Cie propose à son directeur général, M. Dasprivaut la mise en place d'une plateforme collaborative structurée en deux parties: d'un côté les services pour épauler les commerciaux dans leurs activités, de l'autre les services pour les assister dans leurs missions chez les clients.

**Cahier des charges :**

→ Le projet doit permettre de mettre en place des outils de travail collaboratifs accessibles sur les quatre sites de la société.

→ Le projet doit permettre l'homogénéisation des processus des missions conseil

→ Les commerciaux doivent avoir à leur disposition des outils d'aide à la décision

→ L'accès à ces outils doit être sécurisé

→ Le projet doit permettre aux commerciaux de collaborer à plusieurs sur une même mission client.

→ Le projet ne doit pas dépasser un coût de 35 000 € et doit être livré au 28 mars de l'année.

Le projet a été présenté aux différents utilisateurs et M. Dasprivaut est très emballé.

Les commerciaux sont réticents car ils craignent d'avoir plus de contraintes dans leurs activités. De plus, ils ne veulent pas augmenter leur charge de travail par des travaux de saisie supplémentaires.

Mme Maisse, qui a l'habitude de la mise en place de projets innovants, demande à la société B@info de prévoir une petite formation à l'outil pour les rassurer.

(source livre Fontaine Picard p.251)

| Travail à faire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | <p>Quel est le but de ce projet ?</p> <p>La mise en place d'un outil de gestion de la relation client (CRM)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2               | <p>Quels sont les acteurs de l'entreprise qui s'impliquent dans le projet ?</p> <p>Patrick Dasprivaut, directeur général (initiateur du projet)</p> <p>Jeanne Maisse, directrice du système d'information (chef de projet / maîtrise d'œuvre)</p> <p>Les commerciaux, utilisateurs finaux du futur outil</p> <p>Le service commercial (partie prenante majeure)</p> <p>Le prestataire externe "B@info", chargé de la formation et de l'accompagnement</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Le projet est-il d'ordre stratégique, organisationnel ou technologique ?</p> <p>Il s'agit d'un projet à la fois stratégique, organisationnel et technologique :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Stratégique : il vise à renforcer la position concurrentielle et à augmenter les parts de marché.</li><li>-Organisationnel : il modifie les modes de travail des commerciaux et des services supports.</li><li>-Technologique : il introduit un nouvel outil collaboratif (plateforme CRM).</li></ul> |
| 4 | <p>Qui va ici gérer le projet ?</p> <p>Jeanne Maisse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | <p>Quelle est l'utilité du cahier des charges ?</p> <p>Définit les besoins et les objectifs du projet,</p> <p>Précise les contraintes (budget ≤ 35 000 €, durée ≤ 28 mars),</p> <p>Fixe les fonctionnalités attendues (outils collaboratifs, sécurité, homogénéisation des processus),</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | <p>Quels sont les facteurs clés de la réussite de ce projet ?</p> <p>Adhésion des commerciaux à la solution (acceptation du changement)</p> <p>Simplicité et ergonomie de la plateforme</p> <p>Respect du budget et des délais</p> <p>Sécurité et fiabilité des accès</p> <p>Implication de la direction et bonne communication entre services</p> <p>Formation adaptée aux utilisateurs finaux</p>                                                                                                                 |
| 7 | <p>Comment la direction pense-t-elle pouvoir venir à bout de la réticence des commerciaux ?</p> <p>En mettant en place une formation assurée par la société B@info, pour rassurer les commerciaux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

L'ESN B@tInfo a été retenue pour la réalisation de ce projet. Le coût sera de 34 200 € pour l'ensemble de la prestation (analyse, développement, intégration du projet, et déploiement) excluant toutefois la formation utilisateurs ainsi que l'achat de matériels portables (PDA, PC...).

L'ESN B@tInfo met en place une équipe de trois informaticiens pour réaliser le projet de Dem&Cie. Extrait du planning de mise en place de ce projet (la première colonne correspond aux tâches) :

Thameen est le chef de projet sur cette mission. Il est assisté de Nicolas et d'Amira. Pour chacune des tâches qu'il a listées, une estimation des tâches précédentes ainsi que la durée de réalisation de cette tâche a été déterminée dans un tableau.

La participation de chacun pour chaque tâche a aussi été estimée à l'avance. Un planning Gantt permet de planifier le travail (la participation de chacun sur une tâche ne se fait pas forcément en continu).

**Extrait du planning de mise en place de ce projet (la première colonne correspond aux tâches) :**

|   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 | 40 | 41 | 42 |     |     |     |     |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| A | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |
| B | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |
| C |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | TN | TN | TN | TN | TN | T  | T  | T  | T  | T  | T  | T  | T  | T  | TN | TN |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |
| D |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |
| E |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | N  | N  | N  | N  | N  | N  | N  | N  | A  | A  | A  | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN |    |    |    |    |     |     |     |     |
| F |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | N  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |
| G |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | TA  | TA  | TA  | TA  | TA  | TA  | TA  | TA  |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |
| H |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN | TAN |     |    |    |    |    |     |     |     |     |
| I |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | N  | N  |    |    |     |     |     |     |
| J |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    | TAN | TAN | TAN | TAN |

| Travail à faire |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8               | <p>A quoi correspondent les lettres dans les cellules de l'extrait de planning ?</p> <p>Aux initiales des personnes incluses dans ces tâches</p>                                      |
| 9               | <p>Pourquoi utiliser un tel outil ?</p> <p>Pour planifier des tâches dans le temps, et avec les ressources humaines ou matérielles nécessaires.</p>                                   |
| 10              | <p>La tâche E prendrait moins de temps si Amira pouvait y être affectée dès le début. Pourquoi n'est-ce pas possible ?</p> <p>Car est déjà affecté sur la tâche C puis la tâche D</p> |
| 11              | <p>Quelles pourraient être les conséquences d'un retard sur la tâche I ?</p> <p>La fin du projet serait décalée</p>                                                                   |
|                 |                                                                                                                                                                                       |


La nécessité de faire évoluer le SI d'une organisation, pour le rendre plus performant, pour répondre aux nouvelles demandes ou aux nouvelles techniques et technologies, conduit les DSI à mettre en place des projets de SI. Ceux-ci seront matérialisés par la mise en place de produits techniques et organisationnels. La réalisation de ces projets est parfois très complexe, il faut la planifier, la maîtriser et ne pas empêcher le bon fonctionnement du reste de l'organisation.

## Qu'est-ce qu'un projet ?


| Travail à faire |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b>       | Le projet de "Dem & Cie" a-t-il démarré à la création de l'entreprise ?<br><br>Non                                                                                                                                                                                                         |
| <b>13</b>       | Quelle est la date de fin du projet ?<br><br>Le projet doit être livré avant le 28 mars de l'année en cours.                                                                                                                                                                               |
| <b>14</b>       | Est-ce que tous les acteurs de l'entreprise vont participer à la réalisation du projet ?<br><br>Non                                                                                                                                                                                        |
| <b>15</b>       | A l'aide des questions précédentes, proposer une définition du projet.<br><br>Un projet est un ensemble d'actions coordonnées mises en œuvre dans un délai défini, avec des objectifs précis en mobilisant des ressources humaines, techniques et financières, afin d'obtenir un résultat. |

## Quels sont les acteurs d'un projet ?

| Travail à faire |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16</b>       | Qui est demandeur du projet ?<br><br>Patrick Dasprivaut, le directeur général de Dem & Cie                                         |
| <b>17</b>       | Qui contrôlera la réalisation du projet ?<br><br>Jeanne Maisse, la directrice du système d'information (DSI),                      |
| <b>18</b>       | En déduire les 3 types d'acteurs dans un projet et leur principale fonction.<br><br>Le demandeur, le réalisateur et l'utilisateur. |

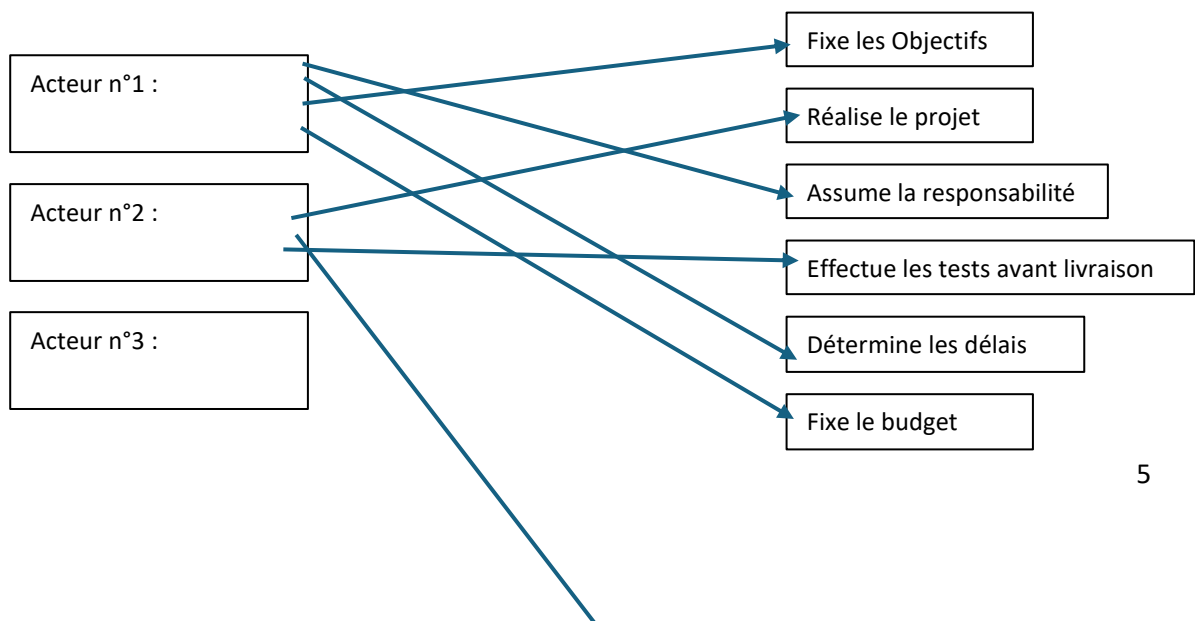

la gestion de projet



Pilote le projet

| Travail à faire |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19              | Après avoir remplis les différents acteurs, relier les rôles aux différents acteurs |

## Quelles sont les priorités d'un projet ?

| Travail à faire |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20              | En reprenant le dernier point du cahier des charges. Trouver les 3 contraintes d'un projet.<br><br>La contrainte de cout (budget), la contrainte de temps (delai) et la contrainte de qualité. |
| 21              | Trouver des risques associer aux 3 contraintes projet.<br><br>Dépassement du budget, retard de développement ou de livraison et dysfonctionnement technique.                                   |

## Le cycle de vie d'un projet

| Travail à faire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22              | Schématiser le cycle de vie du projet de "Dem & Cie" (les grandes étapes du projet : de la demande à l'utilisation de la solution déployée)<br><br>[Besoin exprimé]<br><br>↓<br><br>[Étude préalable / Cahier des charges]<br><br>↓<br><br>[Conception / Développement]<br><br>↓<br><br>[Test et Validation]<br><br>↓<br><br>[Déploiement / Formation]<br><br>↓<br><br>[Utilisation et Suivi] |

## Les facteurs clés de réussite d'un projet de SI

Selon une enquête du cabinet d'études Standish Group (2009) :

- 24 % des projets sont des échecs (abandonnés en cours)
- 44% sont douteux (dépassement de délai ou de coût, absence de certaines fonctionnalités prévues)
- seuls 32% sont des succès.

| Travail à faire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23</b>       | <p>Définir pour chaque scénario pourquoi le projet a été un échec ou un succès.</p> <p>Projet en échec : Mauvaise définition des besoins, Manque de communication entre acteurs</p> <p>Projet douteux : Budget ou délai dépassé, fonctionnalité manquante et bug.</p> <p>Projet réussi : Budget et délai respecté, outil performant et répondant aux attentes du client.</p> |

Dessin Humoristique Travail : Suivi De Projet

